


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021								
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4				
1	ПРОГНОЗЕН ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ РАБОТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Основен ремонт на студентско общежитие блок 15 на НСА „Васил Левски“	504 days	Mon 28.10.19	Thu 30.9.21														
2	ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП	63 days	Mon 28.10.19	Wed 22.1.20														
3	Организиране на публично състезание за възлагане на обществената поръчка	42 days	Mon 28.10.19	Tue 24.12.19														
4	Сключване на договори с избраните изпълнители	21 days	Wed 25.12.19	Wed 22.1.20														
5	ПЪРВИ ЕТАП НА РЕМОНТА - Ниско тяло на СО Блок 1	171 days	Fri 7.2.20	Fri 2.10.20														
6	ОП№1 Вътрешен основен ремонт на ниско тяло - Договор за изпълнение	171 days	Fri 7.2.20	Fri 2.10.20														
7	Писмо за възлагане начало на работите	6 days	Fri 7.2.20	Fri 14.2.20														
8	Изпълнение ремонтни работи	125 days	Mon 17.2.20	Fri 7.8.20														
9	Междинно плащане по Акт обр.19 до 40 % от договора	20 days	Mon 4.5.20	Fri 29.5.20														
10	Междинно плащане по Акт обр.19 до 80 % от договора	20 days	Mon 20.7.20	Fri 14.8.20														
11	Приемане на готовия първи етап от ремонта ниско тяло	20 days	Mon 10.8.20	Fri 4.9.20														
12	издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на ПЪРВИ ЕТАП НА РЕМОНТА	0 days	Fri 4.9.20	Fri 4.9.20														
13	Окончателно плащане по Акт обр.19 и приключване на договора	20 days	Mon 7.9.20	Fri 2.10.20														
14	ВТОРИ ЕТАП НА РЕМОНТА - Високо тяло на СО блок	1279 days	Mon 7.9.20	Thu 30.9.21														
15	ОП№2 Вътрешен основен ремонт на Високо тяло - Договор за изпълнение	279 days	Mon 7.9.20	Thu 30.9.21														

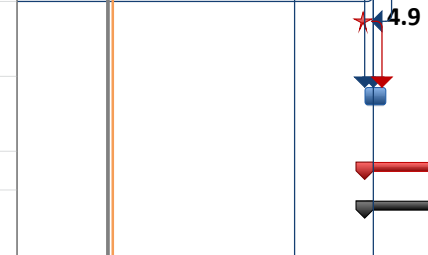

Project: График Date: Tue 29.10.19	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021								
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4				
16	Писмо за възлагане начало на работите	6 days	Mon 7.9.20	Mon 14.9.20														
17	Изпълнение ремонтни работи	233 days	Tue 15.9.20	Thu 5.8.21														
18	Междинно плащане по Акт обр.19 до 30 % от договора	20 days	Wed 16.12.20	Tue 12.1.21														
19	Междинно плащане по Акт обр.19 до 60 % от договора	20 days	Tue 16.2.21	Mon 15.3.21														
20	Междинно плащане по Акт обр.19 до 90 % от договора	20 days	Mon 19.4.21	Fri 14.5.21														
21	Приемане на готовия Втори етап от ремонта	20 days	Fri 6.8.21	Thu 2.9.21														
22	издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на ВТОРИ ЕТАП НА РЕМОНТА	0 days	Thu 2.9.21	Thu 2.9.21														
23	Окончателно плащане по Акт обр.19 и приключване на договора	20 days	Fri 3.9.21	Thu 30.9.21														
24	ОП№3 Топлоизолация и мазилка по фасадата - Договор за изпълнение	409 days	Mon 9.3.20	Thu 30.9.21														
25	ПЪРВИ ЕТАП НА РЕМОНТА	136 days	Mon 9.3.20	Mon 14.9.20														
26	Писмо за възлагане	6 days	Mon 9.3.20	Mon 16.3.20														
27	Изпълнение на топлоизолация по фасади	88 days	Thu 16.4.20	Mon 17.8.20														
28	Междинно плащане по Акт обр.19 за изпълнение на западна и южна фасади	20 days	Wed 17.6.20	Tue 14.7.20														
29	Междинно плащане по Акт обр.19 за изпълнение на източна фасада	20 days	Tue 18.8.20	Mon 14.9.20														
30	ВТОРИ ЕТАП ОТ РЕМОНТА	169 days	Mon 8.2.21	Thu 30.9.21														
31	Писмо за възлагане	2 days	Mon 8.2.21	Tue 9.2.21														
32	Изпълнение на топлоизолация по фасади	100 days	Wed 10.2.21	Tue 29.6.21														

Project: График Date: Tue 29.10.19	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021										
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4						
33	Междинно плащане по Акт обр.19 за изпълнение на западна северна и южна фасади на високото тяло	20 days	Tue 11.5.21	Mon 7.6.21																
34	Окончателно плащане по Акт обр.19 за изпълнение на източна фасада на високото тяло и приключване на договора	20 days	Fri 3.9.21	Thu 30.9.21																
35	ОП№ 4 Подмяна на дограма - Договор за изпълнени	430 days	Fri 7.2.20	Thu 30.9.21																
36	ПЪРВИ ЕТАП	70 days	Fri 7.2.20	Thu 14.5.20																
37	Писмо за възлагане	6 days	Fri 7.2.20	Fri 14.2.20																
38	Доставка и монтаж на дограма	44 days	Mon 17.2.20	Thu 16.4.20																
39	Междинно плащане по Акт обр.19 за завършен монтаж	20 days	Fri 17.4.20	Thu 14.5.20																
40	ВТОРИ ЕТАП	360 days	Fri 15.5.20	Thu 30.9.21																
41	Писмо за възлагане	6 days	Fri 15.5.20	Fri 22.5.20																
42	Доставка и монтаж на дограма от 4 до 7 етажи	55 days	Wed 24.6.20	Tue 8.9.20																
43	Междинно плащане по Акт обр.19 за завършен монтаж на дограма от четвърти до седми етаж включително	20 days	Wed 9.9.20	Tue 6.10.20																
44	Доставка и монтаж на дограма от първи до трети етаж включително	55 days	Wed 7.10.20	Tue 22.12.20																
45	Междинно плащане по Акт обр.19 за завършен монтаж на дограма от първи до трети етаж включително	20 days	Wed 23.12.20	Tue 19.1.21																
46	Доставка и монтаж на входни врати и дограма сутерен	33 days	Thu 22.4.21	Mon 7.6.21																

Project: График Date: Tue 29.10.19	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021											
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4							
47	Окончателно плащане по Акт обр.19 за завършен монтаж на дограма и приключване на договора	20 days	Fri 3.9.21	Thu 30.9.21																	
48	ОП№ 5 Възстановяване на настилки, шахти и тротоари около сградата	278 days	Tue 8.9.20	Thu 30.9.21																	
49	ПЪРВИ ЕТАП	40 days	Tue 8.9.20	Mon 2.11.20																	
50	Писмо за възлагане	1 day	Tue 8.9.20	Tue 8.9.20																	
51	Изпълнение на ремонтни работи	19 days	Wed 9.9.20	Mon 5.10.20																	
52	Междинно плащане по Акт обр.19 за завършен първи етап на ремонта	20 days	Tue 6.10.20	Mon 2.11.20																	
53	ВТОРИ ЕТАП	67 days	Wed 30.6.21	Thu 30.9.21																	
54	Писмо за възлагане	1 day	Wed 30.6.21	Wed 30.6.21																	
55	Изпълнение на ремонтни работи	22 days	Thu 1.7.21	Fri 30.7.21																	
56	Окончателно плащане по Акт обр.19 за завършен втори окончателен етап от ремонта и приключване на договора	20 days	Fri 3.9.21	Thu 30.9.21																	
57	ОП№ 6 Подмяна на два броя пътнически асансьори	273 days	Tue 15.9.20	Thu 30.9.21																	
58	ВТОРИ ЕТАП	273 days	Tue 15.9.20	Thu 30.9.21																	
59	Писмо за възлагане	1 day	Tue 15.9.20	Tue 15.9.20																	
60	Поръчка на оборудване и изпълнение на ремонтни работи по шахтата на асансьорите - релси, врати, машинно	66 days	Thu 17.12.20	Thu 18.3.21																	
61	Междинно плащане за завършен етап на ремонта	20 days	Fri 19.3.21	Thu 15.4.21																	
62	Доставка и монтаж на оборудване	66 days	Fri 16.4.21	Fri 16.7.21																	

Project: График
Date: Tue 29.10.19

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021								
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4				
63	Проби, наладки и пускане в експлоатация на асансьорите	20 days	Mon 19.7.21	Fri 13.8.21														
64	Окончателно плащане и приключване на договора	20 days	Fri 3.9.21	Thu 30.9.21														
65	ОП№ 7 Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа до сградата	380 days	Fri 17.4.20	Thu 30.9.21														
66	ПЪРВИ ЕТАП	121 days	Fri 17.4.20	Fri 2.10.20														
67	Писмо за възлагане	1 day	Fri 17.4.20	Fri 17.4.20														
68	Изработване на работен проект, поръчка на оборудване и окабеляване на инсталацията	66 days	Fri 8.5.20	Mon 10.8.20														
69	Доставка и монтаж на оборудване	11 days	Mon 10.8.20	Mon 24.8.20														
70	Проби, наладки и пускане в експлоатация на системата	5 days	Mon 31.8.20	Fri 4.9.20														
71	Междинно плащане за завършен етап на ремонта	20 days	Mon 7.9.20	Fri 2.10.20														
72	ВТОРИ ЕТАП	100 days	Fri 14.5.21	Thu 30.9.21														
73	Писмо за възлагане	1 day	Fri 14.5.21	Fri 14.5.21														
74	Поръчка на оборудване и окабеляване на инсталацията	44 days	Mon 17.5.21	Thu 15.7.21														
75	Доставка и монтаж на оборудване	11 days	Fri 16.7.21	Fri 30.7.21														
76	Проби, наладки и пускане в експлоатация на системата	5 days	Mon 23.8.21	Fri 27.8.21														
77	Окончателно плащане и приключване на договора	20 days	Fri 3.9.21	Thu 30.9.21														
78	ОП№ 8 Доставка и инсталиране на Абонатна станция	87 days	Tue 19.5.20	Wed 16.9.20														

Project: График
Date: Tue 29.10.19


















Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021								
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4				
79	Писмо за възлагане начало на работите	1 day	Tue 19.5.20	Tue 19.5.20														
80	Изработване на работен проект, поръчка, доставка и монтаж на оборудване	44 days	Thu 4.6.20	Tue 4.8.20														
81	Проби, наладки и пускане в експлоатация на системата	11 days	Wed 5.8.20	Wed 19.8.20														
82	Окончателно плащане и приключване на договора	20 days	Thu 20.8.20	Wed 16.9.20														
83	ОП№ 9 Доставка на смесители и аксесоари за бани	302 days	Mon 8.6.20	Tue 3.8.21														
84	ПЪРВИ ЕТАП	43 days	Mon 8.6.20	Wed 5.8.20														
85	Писмо за доставка	1 day	Mon 8.6.20	Mon 8.6.20														
86	Изпълнение на доставката	22 days	Tue 9.6.20	Wed 8.7.20														
87	Междинно плащане за завършена доставка	20 days	Thu 9.7.20	Wed 5.8.20														
88	ВТОРИ ЕТАП	51 days	Tue 25.5.21	Tue 3.8.21														
89	Писмо за доставка	1 day	Tue 25.5.21	Tue 25.5.21														
90	Изпълнение на доставката	30 days	Wed 26.5.21	Tue 6.7.21														
91	Окончателно плащане за завършена доставка и приключване на договора	20 days	Wed 7.7.21	Tue 3.8.21														
92	ОП№ 10 Мълниезащита	280 days	Tue 18.8.20	Mon 13.9.21														
93	ПЪРВИ ЕТАП	48 days	Tue 18.8.20	Thu 22.10.20														
94	Писмо за възлагане	1 day	Tue 18.8.20	Tue 18.8.20														
95	Поръчка на оборудване и изпълнение на инсталацията	22 days	Wed 19.8.20	Thu 17.9.20														
96	Проби и издаване на протокол на системата за ПЪРВИ ЕТАП НА РЕМОНТА	5 days	Fri 18.9.20	Thu 24.9.20														
97	Междинно плащане за завършен етап на ремонта	20 days	Fri 25.9.20	Thu 22.10.20														

Project: График Date: Tue 29.10.19	Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
	Split		Inactive Task		Manual Summary	
	Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
	Summary		Inactive Summary		Finish-only	
	Project Summary		Manual Task		Deadline	
	External Tasks		Duration-only		Progress	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	19	2020				2021					
					Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	
98	ВТОРИ ЕТАП	54 days	Wed 30.6.21	Mon 13.9.21											
99	Писмо за възлагане	1 day	Wed 30.6.21	Wed 30.6.21											
100	Поръчка на оборудване и изпълнение на инсталацията	22 days	Thu 1.7.21	Fri 30.7.21											
101	Проби и издаване на протокол на системата	11 days	Mon 2.8.21	Mon 16.8.21											
102	Окончателно плащане и приключване на договора	20 days	Tue 17.8.21	Mon 13.9.21											
103	ОП№ 11 Доставка и монтаж на охранителни решетки и леки стоманени конструкции	280 days	Tue 18.8.20	Mon 13.9.21											
104	ПЪРВИ ЕТАП	51 days	Tue 18.8.20	Tue 27.10.20											
105	Писмо за възлагане	1 day	Tue 18.8.20	Tue 18.8.20											
106	Изпълнение на железарските работи	30 days	Wed 19.8.20	Tue 29.9.20											
107	Междинно плащане за завършен етап на ремонта	20 days	Wed 30.9.20	Tue 27.10.20											
108	ВТОРИ ЕТАП	54 days	Wed 30.6.21	Mon 13.9.21											
109	Писмо за възлагане	1 day	Wed 30.6.21	Wed 30.6.21											
110	Изпълнение на железарските работи	33 days	Thu 1.7.21	Mon 16.8.21											
111	Окончателно плащане и приключване на договора	20 days	Tue 17.8.21	Mon 13.9.21											

Project: График
Date: Tue 29.10.19

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	
